

# ZEDLER

## BAUGESELLSCHAFT

2019

## Referenz



### Schloss Heidelberg – Mauererhöhung Bäderterrasse Bohr-, Vernadelungs-, Mauer-, Natursteinarbeiten Vergabe-Nr. 18-2093

**Bausumme:** 220.000,00 € netto

**Ausführungszeit:** 05/2019 bis 11/2019

**Ansprechpartner:**

**Auftraggeber:**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg  
Amt Mannheim und Heidelberg -  
Dienstszentrum Mannheim  
L4 , 4-6  
68161 Mannheim  
Herr Grewenig, Tel: 0621/292-3457

**Ingenieurbüro:**

BfB Büro für Baukonstruktionen  
Rastatter Str. 25  
76199 Karlsruhe  
Herr Dr. Markus Hauer  
Tel: 0721 / 9640131

**Auftragsschwerpunkte:**

Bauzaun	71 m
Verkehrssicherungsplan	1 Stk
Verkehrssicherungseinrichtung	1 Stk
Betonpflaster aus-/einbauen	38 m <sup>2</sup>
Grabenaushub	31 m <sup>3</sup>
Geländer abbauen/herstellen/einbauen	57 m
Natursteinmauerwerk instandsetzen	46 m <sup>3</sup>
Natursteine liefern und anpassen	35m <sup>3</sup>
Heißdampfreinigung	72,50 m
Natursteinmauerwerk Fugen ausräumen und neu verfugen	175 m <sup>2</sup>
Fundament	30 m <sup>3</sup>
Endverankerungen	112 Stk
Kernbohrungen	35 m
Einzelsteinaustausch	7 Stück

Zu Beginn der Maßnahme, nach Fertigstellung des Bauzauns und Fußgängerweges.



Lagerplatz für Steine, Sand und Kalk unterhalb der Baumaßnahme auf der Terrasse




Beginn Rückbau des Pflasters und Grabenaushub



Unerwartet auf alte Leitungen gestoßen,  
vorsichtiges aussschachten des Grabens




Beim Freilegen des Grabens Hohlräume unter  
Brüstungsmauer freigelegt.

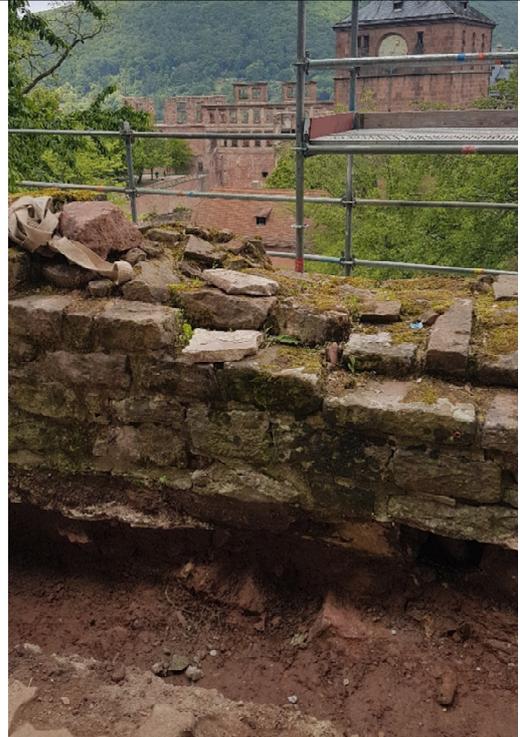

Graben für Streifenfundament bis auf Fels oder  
Frosttiefe freigelegt.

Vorbereitung der Bohrungen zum Verankern des  
Mauerwerkes mit dem Streifenfundament

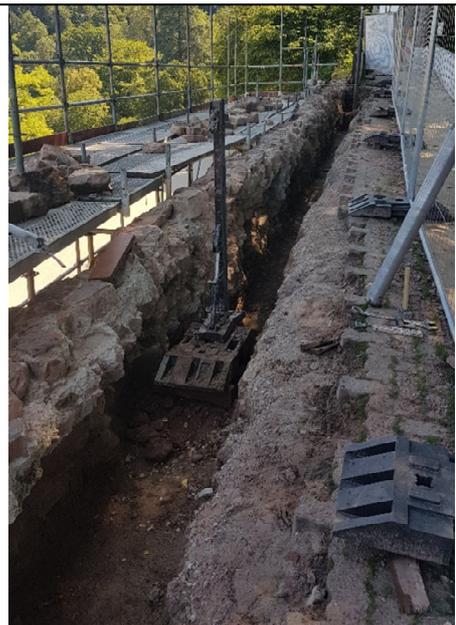

Herstellen der Kernbohrungen



Ankerstäbe / Gewindestangen setzen und verpressen der Bohrlöcher




Bewehren des Streifenfundamentes



Abgetreptes betonieren des Streifenfundamentes



Auffüllen Arbeitsbereich hinter dem Streifenfundament mit Beton zur besseren Stabilisation

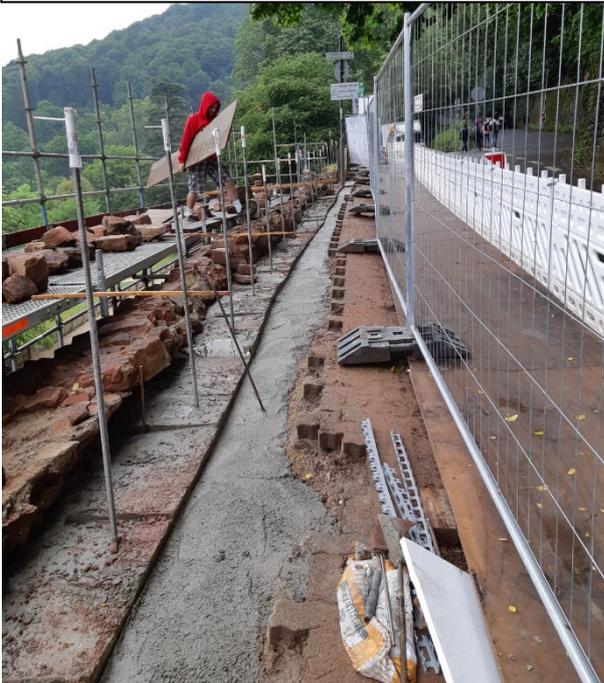

Beginn der Neuaufmauerung der Brüstungsmauer





Einbau des neuen Geländers  
Beipflastern des Geweges



Fertigstellung der Mauererhöhung Bäderterrasse



Rückbau des Gerüsts

